UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA


DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

Clase 7

Estándar PMBOK® 8

Guía del Project Management Institute (PMI)

Principios, dominios de desempeño y procesos para una gestión integral de proyectos.

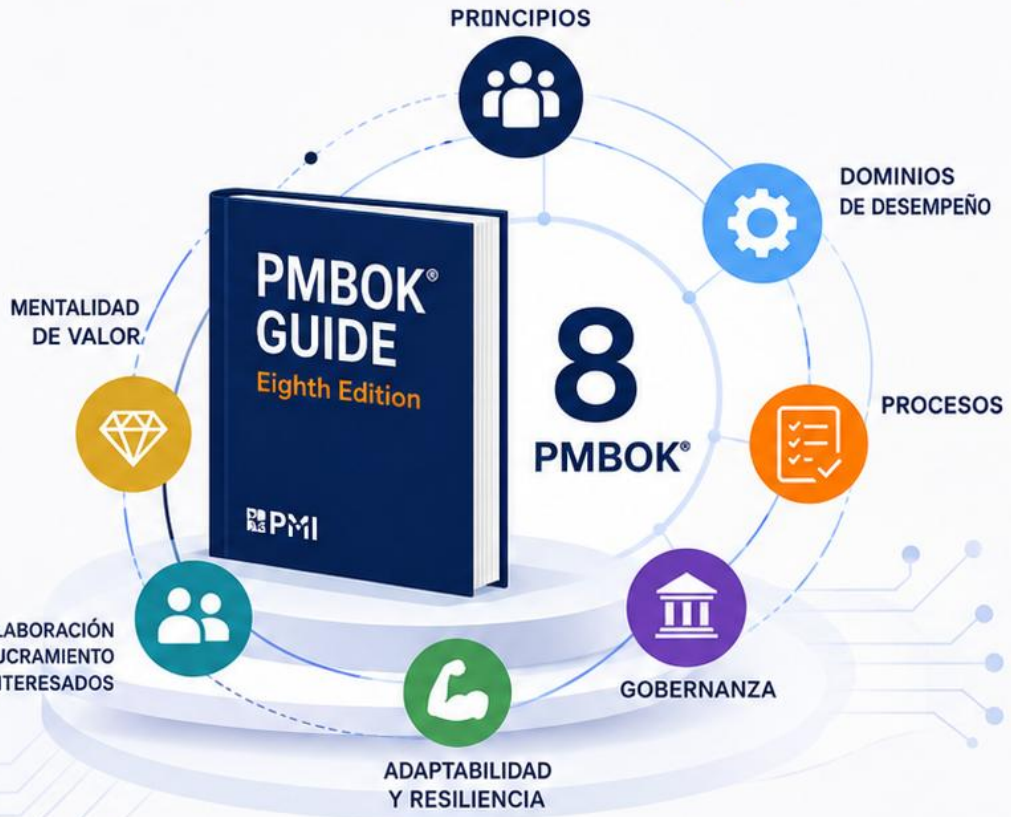

Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

3 de septiembre de 2026

Aula 107
P701 / P702

Índice

01 Definición de estándar

02 Sobre PMI

03 Evolución del estándar PMBOK

04 Estándar PMBOK 8

- Principios del PMBOK 8
- Áreas claves
- Grupos de Procesos
- Procesos del PMBOK

05 Proyecto para PMBOK práctico

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

Definición de Estándar


Los estándares proporcionan **buenas prácticas, principios, procesos y un vocabulario común** para gestionar proyectos de manera profesional y consistente.

ESTÁNDAR

¿Qué debemos considerar?



- Define **principios, procesos y buenas prácticas** para orientar la gestión de proyectos.
- Proporciona un **lenguaje y marco común** para los profesionales de proyectos.
- Puede **aplicarse y adaptarse** a diferentes contextos, industrias y tipos de proyectos.
- Se utiliza como **guía de referencia,** no como una metodología rígida que deba seguirse siempre de la misma manera.

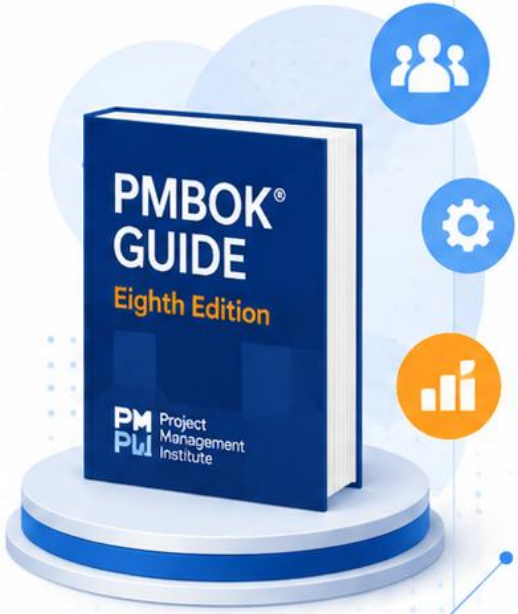

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

Sobre PMI

Project Management Institute®

PMI - Project Management Institute (Instituto de Gestión de Proyectos).


Es una **organización profesional internacional** dedicada a desarrollar estándares, buenas prácticas, certificaciones y recursos relacionados con la **gestión de proyectos**.

PMI es la organización.

PMBOK es uno de los estándares/guías publicados por PMI.

- PMI publica la **Guía PMBOK® (Project Management Body of Knowledge)**, que reúne principios, dominios, procesos y prácticas que sirven como referencia para gestionar proyectos.

- También administra certificaciones profesionales reconocidas internacionalmente, como **PMP® (Project Management Professional).**

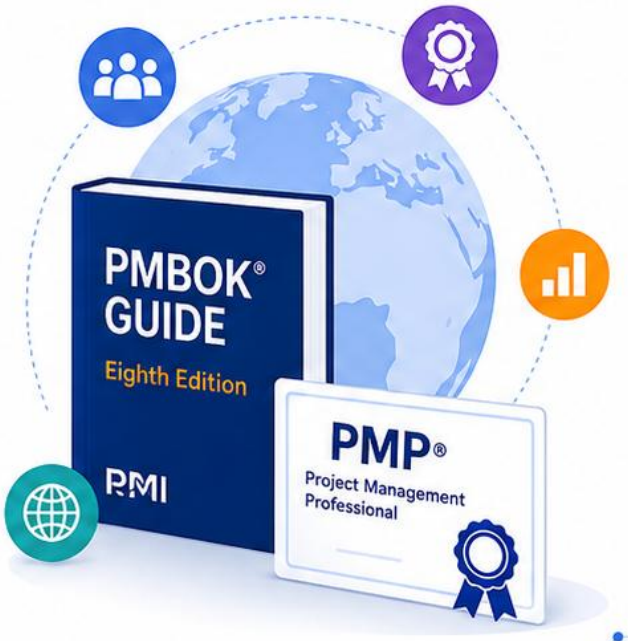

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

Sobre PMI

Resumen: PMI es la institución que desarrolla estándares y buenas prácticas para la gestión de proyectos; PMBOK es una de sus principales referencias para orientar cómo gestionar proyectos de manera profesional."

PMI → Organización internacional

↓

Estándares y guías


↓

PMBOK → Referencia para la gestión de proyectos

↓

Aplicación práctica → Inicio → Planificación → Ejecución → Monitoreo y Control → Cierre.

Project Management Institute.





Evolución del estándar PMBOK® del PMI

Aspecto	PMBOK® 6	PMBOK® 7	PMBOK® 8
Enfoque principal	**Procesos**	**Principios** y desempeño	**Principios + dominios + procesos**
Estructura principal	**10 áreas de conocimiento**	**8 dominios de desempeño**	**7 dominios de desempeño**
Principios	No estructurado en principios	12 principios	6 principios
Procesos	**49 procesos**	No utiliza los 49 procesos como estructura central	**40 procesos**
Organización del trabajo	5 grupos de procesos	Enfoque flexible basado en dominios	**5 áreas de enfoque**
Orientación	¿Qué procesos debemos gestionar?	¿Cómo generar valor y lograr buen desempeño?	**¿Por qué, qué y cómo gestionar el proyecto?**
Adaptación (Tailoring)	Presente	Muy relevante	**Elemento fundamental**
Visión general	Gestión estructurada por procesos	Gestión basada en principios y resultados	**Integra estructura + flexibilidad + valor**
Año	**2017**	**2021**	**2025**

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

Evolución del estándar PMBOK® del PMI

2017

PMBOK® 6

10 áreas de conocimiento + **5 grupos de procesos** → **49 procesos**

Énfasis en **procesos y herramientas**

2021

PMBOK® 7

12 principios + **8 dominios** de desempeño


Énfasis en **valor, resultados y adaptación**

2025

PMBOK® 8

6 principios + **7 dominios** de desempeño + **5 áreas de enfoque** + **40 procesos**

Énfasis en **valor + desempeño + aplicación práctica**




Idea clave: PMBOK 8 no vuelve simplemente al modelo del PMBOK 6. Integra el enfoque basado en **principios y entrega de valor** introducido en PMBOK 7 con una orientación práctica mediante **40 procesos**, permitiendo adaptar la gestión a las características de cada proyecto.

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

El PMBOK® 8:

PMBOK® 8.0: estándar y guía del PMI que proporciona **principios, dominios, procesos y buenas prácticas** para orientar la gestión de proyectos, **adaptándolas** al contexto del proyecto y enfocándose en la **entrega de valor**.

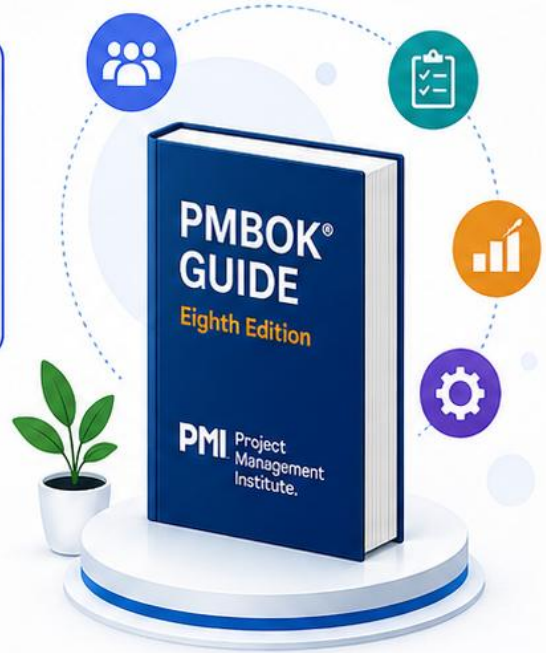

Su enfoque busca que las prácticas de gestión se **adapten *(tailoring)* a las características, necesidades y contexto de cada proyecto**, en lugar de aplicar una metodología rígida.

PMBOK no es una metodología, sino un **estándar y marco de referencia** para la gestión de proyectos.

Principios | Dominios | Procesos | Buenas prácticas

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

Los 6 principios del PMBOK® 8

Principio	Definición breve
1. Adoptar una visión holística (Adopt a Holistic View)	Comprender el proyecto como parte de un **sistema más amplio**, considerando cómo interactúan sus elementos y cómo se relaciona con la organización y su entorno.
2. Enfocarse en el valor (Focus on Value)	Orientar las decisiones y el trabajo del proyecto hacia la generación de resultados y beneficios que aporten **valor** a la organización y a los interesados.
3. Incorporar la calidad en los procesos y entregables (Embed Quality)	Integrar la **calidad** desde el inicio y durante todo el proyecto, procurando que los procesos y resultados satisfagan las necesidades y expectativas establecidas.
4. Ser un líder responsable (Be an Accountable Leader)	Ejercer un **liderazgo** basado en la responsabilidad, integridad y toma de decisiones consciente, asumiendo responsabilidad por las acciones y resultados.
5. Integrar la sostenibilidad (Integrate Sustainability)	Considerar los impactos económicos, sociales y ambientales de las decisiones y resultados del proyecto, buscando generar **valor sostenible.**
6. Construir una cultura de equipo empoderada (Build an Empowered Culture)	Crear un entorno de **confianza, colaboración** y **autonomía,** donde los miembros del equipo puedan participar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

Los 6 principios del PMBOK® 8

6 preguntas que deberían hacerse durante todo el proyecto:

Visión holística:	¿Estamos viendo el proyecto como un todo?
Valor:	¿Esto realmente aporta valor?
Calidad:	¿Estamos haciendo y entregando un trabajo de calidad?
Liderazgo:	¿Estamos tomando decisiones de manera responsable?
Sostenibilidad:	¿Qué impacto tendrán nuestras decisiones a futuro?
Equipo:	¿Nuestro equipo tiene autonomía y condiciones para trabajar bien?



Usa estas preguntas como **guía constante** para tomar mejores decisiones y entregar valor real.

El **PMBOK 8** mantiene la estructura clásica de **cinco grupos de procesos**, que son fundamentales para la gestión de proyectos:



Los **dominios de desempeño** han evolucionado hacia **7 áreas clave**:

1. Gobernanza
2. Alcance
3. Cronograma
4. Finanzas
5. Interesados
6. Recursos
7. Riesgos

El PMBOK 8 identifica **40 procesos** que ahora se vinculan con los siete dominios de desempeño.

Gestión de Proyectos: Desarrollo



5 grupos de procesos

Evolución del estándar **PMBOK® 8**

Estándar PMBOK® 8

40 procesos; agrupados en **5** grupos de procesos y en **7** áreas claves

1. Gobernanza
2. Alcance
3. Cronograma
4. Finanzas
5. Interesados
6. Recursos
7. Riesgos

7 áreas claves

1. Gobernanza

Establece el marco de **dirección, toma de decisiones, responsabilidades y supervisión** del proyecto, procurando que se mantenga alineado con los objetivos de la organización y contribuya a la entrega de valor.



Procesos PMBOK® 8

1.1	Iniciar el proyecto o fase
1.2	Integrar y alinear los planes del proyecto
1.3	Planificar la estrategia de abastecimiento
1.4	Gestionar la ejecución del proyecto
1.5	Gestionar el aseguramiento de la calidad
1.6	Gestionar el conocimiento del proyecto
1.7	Monitorear y controlar el desempeño del proyecto
1.8	Evaluar e implementar cambios
1.9	Cerrar el proyecto o fase

Gestión / Procesos	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	40 Procesos
Gobernanza	1	2	3	2	1	**9**

5 grupos de procesos

2. Alcance

Define y gestiona **qué trabajo y resultados forman parte del proyecto**, asegurando que se comprendan los **requisitos, entregables y límites** necesarios para alcanzar los objetivos establecidos.



Procesos PMBOK® 8

2.1	Planificar la gestión del alcance
2.2	Recopilar y analizar los requisitos
2.3	Definir el alcance
2.4	Desarrollar la estructura del alcance
2.5	Monitorear y controlar el alcance
2.6	Validar el alcance

Gestión / Procesos	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	40 Procesos
Alcance		4		2		6

5 grupos de procesos

3. Cronograma



Organiza y gestiona **cuándo y en qué secuencia se realizará el trabajo**, considerando actividades, dependencias, duraciones y hitos para completar el proyecto dentro de los plazos previstos.

Procesos PMBOK® 8

3.1	Planificar la gestión del cronograma
3.2	Desarrollar el cronograma
3.3	Monitorear y controlar el cronograma

Gestión / Procesos	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	40 Procesos
Cronograma		2		1		3

5 grupos de procesos

4. Finanzas



Gestiona los **recursos financieros del proyecto**, mediante la estimación de costos, elaboración del presupuesto y seguimiento del desempeño financiero para utilizar los fondos de manera adecuada.

Procesos PMBOK® 8

- **4.1** Planificar la gestión financiera
- **4.2** Estimar los costos
- **4.3** Desarrollar el presupuesto
- **4.4** Monitorear y controlar las finanzas

Gestión / Procesos	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	40 Procesos
Finanzas		3		1		4

5 grupos de procesos

5. Interesados



Identifica y gestiona a las **personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse afectados por el proyecto**, promoviendo su participación y una comunicación adecuada durante el desarrollo del proyecto.

Procesos PMBOK® 8

5.1	Identificar a los interesados
5.2	Planificar el involucramiento de los interesados
5.3	Planificar la gestión de las comunicaciones
5.4	Gestionar el involucramiento de los interesados
5.5	Gestionar las comunicaciones
5.6	Monitorear el involucramiento de los interesados
5.7	Monitorear las comunicaciones

Gestión / Procesos	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	40 Procesos
Interesados	1	2	2	2		7

5 grupos de procesos

6. Recursos



Planifica, obtiene y gestiona los **recursos humanos, físicos y tecnológicos** necesarios para realizar el trabajo, procurando su disponibilidad y utilización efectiva durante el proyecto.

Procesos PMBOK® 8

6.1	Planificar la gestión de recursos
6.2	Estimar los recursos
6.3	Adquirir recursos
6.4	Liderar el equipo
6.5	Monitorear y controlar los recursos

Gestión / Procesos	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	40 Procesos
Recursos		2	2	1		5

5 grupos de procesos

7. Riesgos



Identifica, analiza y gestiona la **incertidumbre** que puede afectar **los objetivos del proyecto,** definiendo respuestas para reducir amenazas y aprovechar oportunidades que puedan surgir.

Procesos PMBOK® 8

7.1	Planificar la gestión de riesgos
7.2	Identificar los riesgos
7.3	Realizar el análisis de riesgos
7.4	Planificar las respuestas a los riesgos
7.5	Implementar las respuestas a los riesgos
7.6	Monitorear los riesgos

Gestión / Procesos	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	40 Procesos
Riesgos	4	1	1	1		6

5 grupos de procesos

Gestión de Proyectos: Desarrollo



5 grupos de procesos

Evolución del estándar PMBOK® 8

Estándar PMBOK® 8

40 procesos; agrupados en **5** grupos de procesos y en **7** áreas claves

1. Gobernanza
2. Alcance
3. Cronograma
4. Finanzas
5. Interesados
6. Recursos
7. Riesgos

7 áreas claves

GRUPOS DE PROCESOS

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

1. **Inicio** — Definición del proyecto y autorización formal para comenzar.
2. **Planificación** — Desarrollo de un plan que guíe la ejecución.
3. **Ejecución** — Realización de las actividades del proyecto.
4. **Monitoreo y control** — Seguimiento del desempeño y ajustes necesarios.
5. **Cierre** — Finalización del proyecto y entrega de resultados.

Gestión de Proyectos: Desarrollo

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA



5 grupos de procesos

Evolución del estándar PMBOK® 8

Estándar PMBOK® 8

40 procesos; agrupados en **5** grupos de procesos y en **7** áreas claves

1. Gobernanza
2. Alcance
3. Cronograma
4. Finanzas
5. Interesados
6. Recursos
7. Riesgos

7 áreas claves

MATRIZ DE ÁREA CLAVES vs PROCESOS

ESTÁNDAR PMBOK® 8

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA

Gestión / Procesos	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	40 Procesos
1. Gobernanza	1	2	3	2	1	9
2. Alcance		4		2		6
3. Cronograma		2		1		3
4. Finanzas		3		1		4
5. Interesados	1	2	2	2		7
6. Recursos		2	2	1		5
7. Riesgos		4	1	1		6

La matriz muestra la distribución de los procesos (40 en total) entre las 7 áreas clave y los 5 grupos de procesos del estándar PMBOK® 8.

40
PROCESOS EN TOTAL

MATRIZ DE ÁREA CLAVE vs PROCESOS

ESTÁNDAR PMBOK® 8

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA

	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre
1. Gobernanza	1.1 Iniciar el Proyecto o Fase	1.2 Integrar y Alinear los Planes del Proyecto 1.3 Planificar la Estrategia de Abastecimiento	1.4 Gestionar la Ejecución del Proyecto 1.5 Gestionar el Aseguramiento de la Calidad 1.6 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	1.7 Monitorear y Controlar el Desempeño del Proyecto 1.8 Evaluar e Implementar Cambios	1.9 Cerrar el Proyecto o Fase
2. Alcance	–	2.1 Planificar la Gestión del Alcance 2.2 Recopilar y Analizar los Requisitos 2.3 Definir el Alcance 2.4 Desarrollar la Estructura del Alcance	–	2.5 Monitorear y Controlar el Alcance 2.6 Validar el Alcance	–
3. Cronograma	–	3.1 Planificar la Gestión del Cronograma 3.2 Desarrollar el Cronograma	–	3.3 Monitorear y Controlar el Cronograma	–
4. Finanzas	–	4.1 Planificar la Gestión Financiera 4.2 Estimar los Costos 4.3 Desarrollar el Presupuesto	–	4.4 Monitorear y Controlar las Finanzas	–
5. Interesados	5.1 Identificar a los Interesados	5.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados 5.3 Planificar la Gestión de las Comunicaciones	5.4 Gestionar el Involucramiento de los Interesados 5.5 Gestionar las Comunicaciones	5.6 Monitorear el Involucramiento de los Interesados 5.7 Monitorear las Comunicaciones	–
6. Recursos	–	6.1 Planificar la Gestión de Recursos 6.2 Estimar los Recursos	6.3 Adquirir Recursos 6.4 Liderar el Equipo	6.5 Monitorear y Controlar los Recursos	–
7. Riesgos	–	7.1 Planificar la Gestión de Riesgos 7.2 Identificar los Riesgos 7.3 Realizar el Análisis de Riesgos 7.4 Planificar las Respuestas a los Riesgos	7.5 Implementar las Respuestas a los Riesgos	7.6 Monitorear los Riesgos	–
Total de Procesos	2 procesos	19 procesos	8 procesos	10 procesos	1 proceso

TOTAL PMBOK® 8: 40 PROCESOS 7 Dominios de Desempeño • 5 Áreas de Enfoque

Los procesos interactúan a lo largo del ciclo de vida del proyecto. No son fases secuenciales rígidas.

PROYECTO PARA PMBOK – PRÁCTICO

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

Nombre del proyecto	
Problema	
Objetivo del proyecto	
Integrantes	

- Describa el **problema** a resolver
- Defina el **objetivo** del proyecto
- Identifica los **usuarios** involucrados
- Nombre de su **proyecto**
- **3 integrantes**

Diligenciar
formulario con
los datos.

MATRIZ DE ÁREA CLAVE vs PROCESOS

ESTÁNDAR PMBOK® 8

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA

	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre
1. Gobernanza	1.1 Iniciar el Proyecto o Fase	1.2 Integrar y Alinear los Planes del Proyecto 1.3 Planificar la Estrategia de Abastecimiento	1.4 Gestionar la Ejecución del Proyecto 1.5 Gestionar el Aseguramiento de la Calidad 1.6 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	1.7 Monitorear y Controlar el Desempeño del Proyecto 1.8 Evaluar e Implementar Cambios	1.9 Cerrar el Proyecto o Fase
2. Alcance	–	2.1 Planificar la Gestión del Alcance 2.2 Recopilar y Analizar los Requisitos 2.3 Definir el Alcance 2.4 Desarrollar la Estructura del Alcance	–	2.5 Monitorear y Controlar el Alcance 2.6 Validar el Alcance	–
3. Cronograma	–	3.1 Planificar la Gestión del Cronograma 3.2 Desarrollar el Cronograma	–	3.3 Monitorear y Controlar el Cronograma	–
4. Finanzas	–	4.1 Planificar la Gestión Financiera 4.2 Estimar los Costos 4.3 Desarrollar el Presupuesto	–	4.4 Monitorear y Controlar las Finanzas	–
5. Interesados	5.1 Identificar a los Interesados	5.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados 5.3 Planificar la Gestión de las Comunicaciones	5.4 Gestionar el Involucramiento de los Interesados 5.5 Gestionar las Comunicaciones	5.6 Monitorear el Involucramiento de los Interesados 5.7 Monitorear las Comunicaciones	–
6. Recursos	–	6.1 Planificar la Gestión de Recursos 6.2 Estimar los Recursos	6.3 Adquirir Recursos 6.4 Liderar el Equipo	6.5 Monitorear y Controlar los Recursos	–
7. Riesgos	–	7.1 Planificar la Gestión de Riesgos 7.2 Identificar los Riesgos 7.3 Realizar el Análisis de Riesgos 7.4 Planificar las Respuestas a los Riesgos	7.5 Implementar las Respuestas a los Riesgos	7.6 Monitorear los Riesgos	–
Total de Procesos	2 procesos	19 procesos	8 procesos	10 procesos	1 proceso

TOTAL PMBOK® 8: 40 PROCESOS 7 Dominios de Desempeño • 5 Áreas de Enfoque

Los procesos interactúan a lo largo del ciclo de vida del proyecto. No son fases secuenciales rígidas.

PROYECTO PARA PMBOK - PRÁCTICO

	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre
Pregunta que debe responder el estudiante	¿Qué proyecto haremos y por qué?	¿Cómo lo vamos a realizar?	¿Cómo gestionamos el trabajo?	¿Vamos según lo planificado?	¿Qué conseguimos y qué aprendimos?
Producto	Acta + interesados	Plan de gestión de proyecto	Informe de ejecución	Informe de control + cambios	Informe de cierre
Total de Procesos	**2** procesos	**19** procesos	**8** procesos	**10** procesos	**1** proceso

PROYECTO PARA PMBOK – PRÁCTICO

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

Nombre del proyecto	
Problema	
Objetivo del proyecto	
Integrantes	

- Describa el **problema** a resolver
- Defina el **objetivo** del proyecto
- Identifica los **usuarios** involucrados
- Nombre de su **proyecto**
- **3 integrantes**

Diligenciar
formulario con
los datos.

Proyectos para PMBOK - Gestión de Proyectos



Hasta el lunes 7 de septiembre a las 8 am

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA


DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

Clase 7

Estándar PMBOK® 8

Guía del Project Management Institute (PMI)

Principios, dominios de desempeño y procesos para una gestión integral de proyectos.

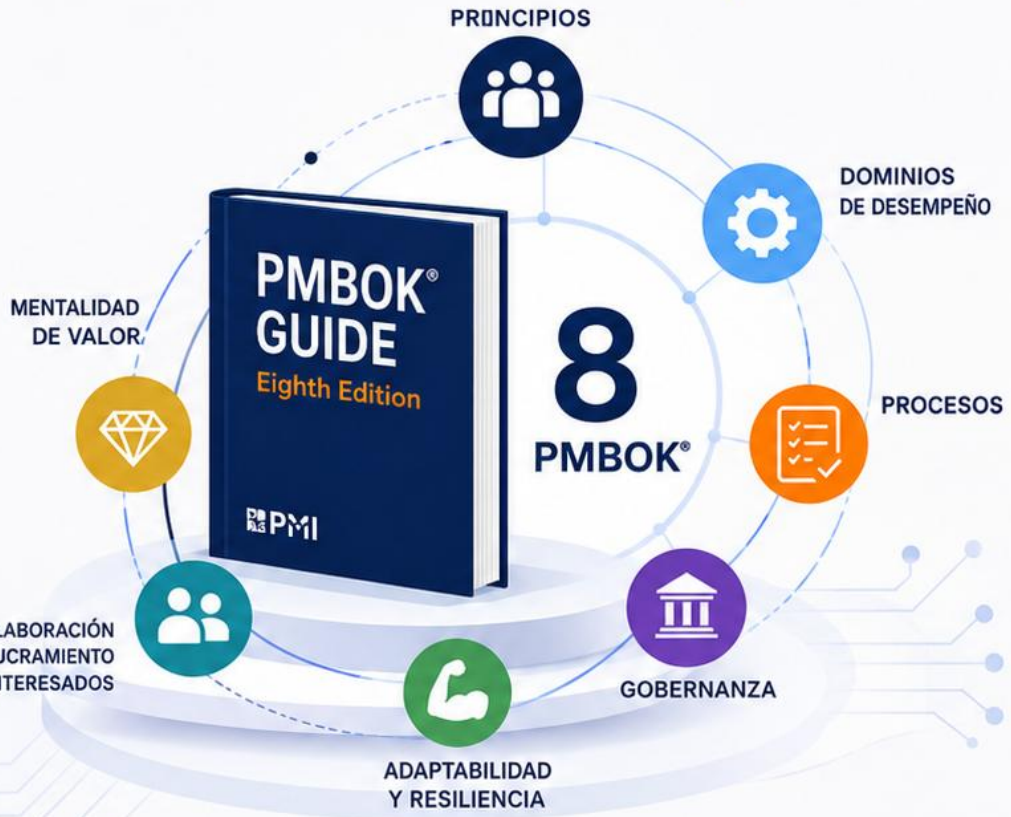

Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

3 de septiembre de 2026

Aula 107
P701 / P702
