UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

Clase 8

PMBOK® 8
Procesos de Inicio

De la idea al proyecto:
Iniciando con una base sólida



En esta clase revisaremos los **procesos de inicio del PMBOK 8** y su aplicación práctica en sus proyectos.

Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

10 de septiembre de 2026

Aula 107
P701 / P702

Índice

GESTIÓN DE PROYECTOS – PMBOK® 8

De una idea a un proyecto con valor

01	**Recordando: Los 6 principios del PMBOK 8**	Principios que guían la gestión de proyectos.
02	**Grupos de procesos del PMBOK 8**	Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre.
03	**Fase Inicio: actividades y entregables**	¿Qué hacemos en esta fase? Acta de Constitución y Registro de Interesados.
04	**Trabajo práctico: Procesos de Inicio**	Aplicación a su proyecto. Uso de la plantilla.
05	**Entregables (Aula)**	Instrucciones de entrega, fecha y formato.

Los 6 principios del PMBOK® 8

UNA GUÍA PARA TOMAR MEJORES DECISIONES Y GENERAR VALOR

6 preguntas que deberían hacerse durante todo el proyecto:

1	**Adoptar una visión holística** (Adopt a Holistic View)	¿Estamos viendo el proyecto **como un todo?**
2	**Enfocarse en el valor** (Focus on Value)	¿Esto realmente **aporta valor?**
3	**Incorporar la calidad en los procesos y entregables** (Embed Quality)	¿Estamos haciendo y entregando un **trabajo de calidad?**
4	**Ser un líder responsable** (Be an Accountable Leader)	¿Estamos tomando **decisiones de manera responsable?**
5	**Integrar la sostenibilidad** (Integrate Sustainability)	¿Qué **impacto** tendrán nuestras decisiones **a futuro?**
6	**Construir una cultura de equipo empoderada** (Build an Empowered Culture)	¿Nuestro equipo tiene **autonomía y condiciones** para trabajar bien?



Usa estas preguntas como **guía constante** para tomar mejores decisiones y entregar valor real.

De una idea a un proyecto con valor

Gestión de Proyectos: Desarrollo



5 grupos de procesos

Evolución del estándar PMBOK® 8

Estándar PMBOK® 8

40 procesos; agrupados en **5** grupos de procesos y en **7** áreas claves

1. Gobernanza
2. Alcance
3. Cronograma
4. Finanzas
5. Interesados
6. Recursos
7. Riesgos

7 áreas claves

GRUPOS DE PROCESOS

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

1. **Inicio** — Definición del proyecto y autorización formal para comenzar.
2. **Planificación** — Desarrollo de un plan que guíe la ejecución.
3. **Ejecución** — Realización de las actividades del proyecto.
4. **Monitoreo y control** — Seguimiento del desempeño y ajustes necesarios.
5. **Cierre** — Finalización del proyecto y entrega de resultados.

Gestión de Proyectos
PMBOK® 8

MATRIZ DE ÁREA CLAVES vs PROCESOS

ESTÁNDAR PMBOK® 8

ÁREA CLAVE DE ENFOQUE	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	Total de procesos
1. Gobernanza	1 (Iniciar el Proyecto o Fase)	2	3	2	1	9
2. Alcance	-	4	-	2	-	6
3. Cronograma	-	2	-	1	-	3
4. Finanzas	-	3	-	1	-	4
5. Interesados	1 (Identificar a los Interesados)	2	2	2	-	7
6. Recursos	-	2	2	1	-	5
7. Riesgos	-	4	1	1	-	6

Pregunta clave — ¿Qué proyecto haremos y por qué?

Producto — Acta de Constitución + Registro de interesados

40 PROCESOS EN TOTAL

1. Gobernanza

Establece el marco de **dirección, toma de decisiones, responsabilidades y supervisión** del proyecto, procurando que se mantenga alineado con los objetivos de la organización y contribuya a la entrega de valor.



Procesos PMBOK® 8

1.1	Iniciar el proyecto o fase
1.2	Integrar y alinear los planes del proyecto
1.3	Planificar la estrategia de abastecimiento
1.4	Gestionar la ejecución del proyecto
1.5	Gestionar el aseguramiento de la calidad
1.6	Gestionar el conocimiento del proyecto
1.7	Monitorear y controlar el desempeño del proyecto
1.8	Evaluar e implementar cambios
1.9	Cerrar el proyecto o fase

Gestión / Procesos	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	40 Procesos
Gobernanza	1	2	3	2	1	**9**

5 grupos de procesos

5. Interesados



Identifica y gestiona a las **personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse afectados por el proyecto**, promoviendo su participación y una comunicación adecuada durante el desarrollo del proyecto.

Procesos PMBOK® 8

5.1	Identificar a los interesados
5.2	Planificar el involucramiento de los interesados
5.3	Planificar la gestión de las comunicaciones
5.4	Gestionar el involucramiento de los interesados
5.5	Gestionar las comunicaciones
5.6	Monitorear el involucramiento de los interesados
5.7	Monitorear las comunicaciones

Gestión / Procesos	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	40 Procesos
Interesados	1	2	2	2		7

5 grupos de procesos

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

PMBOK 8: PROCESOS DE INICIO

DE UNA IDEA A UN PROYECTO

Pregunta guía de Inicio:

¿Qué proyecto vamos a realizar, por qué es necesario y quiénes están involucrados?

¿Qué buscamos en esta etapa?

Transformar una **idea o necesidad** en un proyecto claramente definido, comprendiendo **por qué es realizará, qué se espera conseguir** y **quiénes estarán involucrados o afectados.**

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: Fase Inicio

Acta de Constitución + Registro Inicial de Interesados

01 INICIAR EL PROYECTO O FASE

Formalizar el proyecto y establecer sus elementos iniciales.

Resultado Acta de Constitución del Proyecto

02 IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS

Reconocer quiénes pueden afectar o verse afectados por el proyecto.

Resultado Registro inicial de Interesados

Al finalizar esta etapa, tenemos un proyecto definido inicialmente.



ACTIVIDAD 1

Iniciar el proyecto o fase

¿En qué consiste?

Iniciar el proyecto o fase permite establecer formalmente la existencia del proyecto y generar una comprensión inicial compartida sobre el **problema, propósito, objetivos, beneficios, alcance inicial, restricciones** y **responsables.**




Producto de la actividad →

Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

El Acta de Constitución no es todavía el Plan del Proyecto.

Contiene información de **alto nivel** que posteriormente será desarrollada y detallada durante la planificación.



ACTIVIDAD 1 – Iniciar el proyecto o fase

¿Qué necesitamos conocer inicialmente?

NECESIDAD / PROBLEMA	¿Qué situación, problema u oportunidad da origen al proyecto?
PROPÓSITO	¿Por qué es necesario realizar este proyecto? ¿Qué valor aportará?
OBJETIVO	¿Qué queremos lograr? (Resultado esperado)
ALCANCE INICIAL	¿Qué incluye y qué no incluye inicialmente? (Límites preliminares del proyecto)
BENEFICIOS ESPERADOS	¿Qué resultados o mejoras se esperan obtener?
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS	¿Qué limitaciones y condiciones debemos considerar inicialmente?
SPONSOR + RESPONSABLE DEL PROYECTO	¿Quién patrocina el proyecto? ¿Quién será responsable de su gestión?

De una idea a un proyecto definido

El Acta de Constitución contiene información de **alto nivel**, que será desarrollada y detallada durante la planificación.

ACTA DE CONSTITUCIÓN
(Project Charter)

Documento que formaliza la existencia del proyecto y resume su información inicial.



ACTIVIDAD 1 – Iniciar el proyecto o fase

Nuestro proyecto ejemplo

Proyecto: Sistema Reserva USM de Laboratorios

Problema

Existen reservas duplicadas, poca visibilidad de la disponibilidad de los laboratorios y una alta carga de trabajo administrativo asociada a la gestión manual de las reservas.

Objetivo

Diseñar e implementar, en un plazo de **6 meses**, un prototipo funcional que permita consultar la disponibilidad y gestionar las reservas de los laboratorios de la universidad.

Beneficio esperado

Reducir errores y tiempos asociados al proceso de reserva de laboratorios.



Presupuesto
$10.000.000

Duración
6 meses

Sponsor
Dirección Académica

¿Con esta información podemos comenzar inmediatamente a desarrollar el sistema?

Todavía debemos comprender y formalizar mejor el proyecto.

Necesitamos un Acta de Constitución

ACTIVIDAD 1 – Iniciar el proyecto o fase

Construyamos el Acta de Constitución

Definición:
El Acta de Constitución es el documento que **formaliza la existencia del proyecto** y establece sus **principales antecedentes, objetivos, condiciones iniciales** y **autoridad** para desarrollarlo.

	Elemento	¿Qué debemos definir?
1	**Nombre**	¿Cómo identificaremos el proyecto?
2	**Problema/necesidad**	¿Qué situación queremos resolver?
3	**Justificación**	¿Por qué es necesario realizarlo?
4	**Objetivo**	¿Qué resultado queremos alcanzar?
5	**Solución inicial**	¿Qué proponemos desarrollar?
6	**Beneficios esperados**	¿Qué valor generará?
7	**Alcance inicial**	¿Qué contempla inicialmente?
8	**Duración estimada**	¿Cuánto tiempo tenemos?
9	**Presupuesto inicial**	¿Cuánto podemos invertir?
10	**Sponsor**	¿Quién respalda/autoriza el proyecto?



Este documento será la base para las siguientes etapas del proyecto.

ACTIVIDAD 1 – Iniciar el proyecto o fase

Construyamos el Acta de Constitución

ACTA DE CONSTITUCIÓN — Reserva USM

Elemento	Ejemplo
Nombre	Sistema Reserva USM de Laboratorios
Problema/Necesidad	Reservas duplicadas, poca visibilidad de disponibilidad y alta carga administrativa.
Propósito	Mejorar la gestión de reservas de laboratorios mediante una solución digital centralizada.
Objetivo	Diseñar e implementar en 6 meses un prototipo funcional para consultar disponibilidad y gestionar reservas.
Beneficio esperado	Reducir errores y tiempos asociados al proceso de reserva.
Duración	6 meses
Presupuesto	$10.000.000
Sponsor	Dirección Académica

De una idea a un proyecto definido



ACTIVIDAD 1 – Iniciar el proyecto o fase

Definamos el alcance inicial



¿Qué creen que debería incluir este proyecto?
Conversemos... ¿Qué funcionalidades o elementos consideran importantes?

Incluye inicialmente

- Consulta de disponibilidad de laboratorios
- Solicitud de reservas
- Confirmación/cancelación de reservas
- Administración de laboratorios y horarios
- Gestión básica de usuarios
- Prototipo funcional

No incluye inicialmente

- Reserva de salas externas a la universidad
- Gestión de equipamiento individual
- Sistema de control de acceso físico
- Aplicación móvil nativa
- Integración con sistemas externos en esta primera versión

El alcance inicial nos ayuda a establecer límites claros y a focalizar el esfuerzo en lo más importante para esta primera versión del proyecto.

Alcance claro, proyectos exitosos

ACTIVIDAD 1 – Iniciar el proyecto o fase

Restricciones y supuestos

Restricciones

Condiciones que **limitan las decisiones** del proyecto.

Para Reserva USM:

Tiempo:
máximo 6 meses.

Presupuesto:
máximo $10.000.000.

Tecnología:
debe utilizar infraestructura tecnológica disponible en la universidad.

Supuestos

Condiciones que **consideramos verdaderas** para poder planificar, pero que deberán verificarse.

Para Reserva USM:

- Los laboratorios tendrán acceso a Internet.
- Dirección Académica facilitará información de horarios.
- Los usuarios participarán en las pruebas.
- El equipo TI estará disponible para apoyar la implementación.

¿Qué ocurre si uno de nuestros supuestos resulta falso?
Podría afectar el alcance, el tiempo, el costo o incluso la viabilidad del proyecto.

Estos casos se analizan como parte de los **Riesgos** del proyecto, que veremos más adelante.

ACTIVIDAD 1 – Iniciar el proyecto o fase

Resultado Actividad 1

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Al finalizar deberíamos poder responder:

¿Por qué?	→	Problema / necesidad
¿Para qué?	→	Propósito y beneficios
¿Qué queremos conseguir?	→	Objetivo
¿Qué haremos inicialmente?	→	Alcance de alto nivel
¿Con qué límites?	→	Tiempo y presupuesto
¿Bajo qué condiciones?	→	Supuestos y restricciones
¿Quién respalda el proyecto?	→	Sponsor
¿Quién lo gestionará?	→	Project Manager



De una idea a un proyecto

El proyecto queda formalmente definido para continuar su desarrollo.

ACTIVIDAD 2 — Identificar a los interesados

Identificar a los interesados



"Ya sabemos qué queremos hacer.
Ahora necesitamos saber **quiénes están relacionados con nuestro proyecto.**"



¿Qué es un interesado?

Interesado (Stakeholder): persona, grupo u organización que **puede afectar, verse afectada o percibirse afectada** por una decisión, actividad o resultado del proyecto.



¿Quién decide?

Quienes tienen autoridad o toman decisiones sobre el proyecto.



¿Quién participa?

Quienes trabajan directamente en el proyecto o colaboran en su ejecución.



¿Quién se ve afectado?

Quienes pueden verse beneficiados o perjudicados por los resultados del proyecto.



Interesado ≠ Usuario

Un usuario puede ser un interesado, pero existen interesados que nunca utilizarán el sistema.

El proyecto impacta a más personas de las que usan el sistema

ACTIVIDAD 2 – Identificar a los interesados

Identifiquemos interesados de Reserva USM



¿Quiénes creen que son interesados del proyecto Reserva USM?

Analicemos qué personas, grupos u organizaciones están relacionadas con el proyecto.



Estudiantes

Utilizan los laboratorios para sus actividades académicas.



Docentes

Utilizan y solicitan laboratorios para sus actividades académicas.



Dirección Académica

Define lineamientos y respalda el proyecto.



Departamento TI

Proporciona soporte tecnológico y infraestructura.



Administradores de laboratorios

Gestionan el uso y la disponibilidad de los laboratorios.



Personal administrativo

Apoya la gestión y procesos relacionados con las reservas.



Equipo del proyecto

Encargado de planificar, desarrollar e implementar la solución.

Un proyecto exitoso considera a todos sus interesados

ACTIVIDAD 2 – Identificar a los interesados

No todos los interesados son iguales

¿Tiene el mismo poder / interés sobre el proyecto un estudiante que Dirección Académica?

¿Tienen ambos interés / influencia en el proyecto?

La respuesta es no, pero ambos son interesados.

Interés:
¿Cuánto le importa el proyecto?

Poder / influencia:
¿Cuánto puede afectar las decisiones o resultados del proyecto?

Matriz Poder × Interés



Ejemplos para Reserva USM:

Gestionar de cerca:
- Dirección Académica
- Administradores de laboratorios

Mantener satisfecho:
- Departamento TI (dependiendo de su rol)

Mantener informado:
- Docentes
- Estudiantes

Monitorear:
- Otros miembros de la comunidad universitaria no usuarios del sistema.

¿Todos los interesados deberían recibir la misma información y participar de la misma manera?

No. Cada interesado requiere un enfoque y una estrategia de comunicación diferente.

ACTIVIDAD 2 — Identificar a los interesados

Registro de Interesados

Interesado	Rol / relación	Poder	Interés	Necesidad/ expectativa	Estrategia inicial
Dirección Académica	Sponsor	Alto	Alto	Mejorar gestión	Gestionar de cerca
Administrador de laboratorios	Usuario clave	Alto	Alto	Reducir trabajo manual	Gestionar de cerca
Docentes	Usuario	Medio	Alto	Reservar fácilmente	Mantener informado
Estudiantes	Usuario	Bajo	Alto	Consultar disponibilidad	Mantener informado
Departamento TI	Soporte tecnológico	Alto	Medio	Solución compatible	Mantener satisfecho



Identificar al interesado no significa solamente escribir su nombre.
Debemos comprender **qué espera del proyecto** y **cómo puede influir en él.**

ACTIVIDAD 2 — Identificar a los interesados

Actividad práctica 2: Ahora ustedes

Identifiquen los interesados de su proyecto

Cada equipo debe identificar inicialmente **entre 5 y 8 interesados.**


Conozcan a sus interesados para un proyecto más exitoso

1 Para cada interesado, establezcan:

Completen la siguiente información:

Interesado	Rol / relación	Necesidad o expectativa	Interés	Influencia

2 Luego, ubiquenlos en la Matriz Poder / Interés

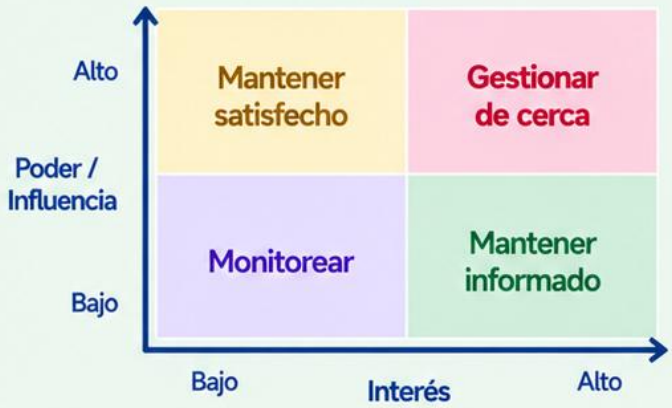

3 Reflexionen como equipo:

¿Cuál es el interesado más crítico para el éxito de su proyecto y por qué?

ETAPA 1 • INICIO

Así cerramos INICIO

Un buen inicio sienta las bases de un proyecto exitoso

Problema / Necesidad
Identificamos la necesidad que da origen al proyecto.

¿Por qué es necesario?

1 INICIAR EL PROYECTO
Definimos y autorizamos formalmente el proyecto.

Acta de Constitución

¿Qué proyecto queremos realizar?

2 IDENTIFICAR INTERESADOS
Reconocemos quiénes están relacionados con el proyecto.

Registro de Interesados

¿Quiénes están involucrados?

PROYECTO AUTORIZADO Y CONTEXTO INICIAL COMPRENDIDO

Base para avanzar a la siguiente etapa.

SIGUIENTE → PLANIFICACIÓN

Ahora definiremos **CÓMO** lo vamos a realizar.



Ahora sabemos **QUÉ** proyecto queremos realizar, **POR QUÉ** es necesario y **QUIÉNES** están involucrados.

La siguiente pregunta será: **¿CÓMO** lo vamos a realizar?

De una idea a un proyecto con valor

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

Clase 8

PMBOK® 8
Procesos de Inicio

De la idea al proyecto:
Iniciando con una base sólida



En esta clase revisaremos los **procesos de inicio del PMBOK 8** y su aplicación práctica en sus proyectos.

Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

10 de septiembre de 2026

Aula 107
P701 / P702
