Clase 11

Fase de Planificación

Planificando el camino hacia el éxito



Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

29 de septiembre de 2026

Laboratorio
P701

Índice de hoy



1. Definición de riesgos
2. Dimensiones de los riesgos
3. Tipos de riesgos
4. Gestión de los riesgos
5. Procesos de planificación:
   - 5.1 Planificar la gestión de riesgos
   - 5.2 Identificar los riesgos
   - 5.3 Realizar el análisis de riesgos
   - 5.4 Planificar las respuestas a los riesgos
6. Entregable: Matriz de riesgos

Fase de Planificación

Procesos por área clave (PMBOK® 8)

Área clave (Dominio de desempeño)	Inicio (2 procesos)	Planificación (19 procesos)
1. **GOBERNANZA** (9 procesos)	1. Iniciar el proyecto o fase	2. Desarrollar el plan de gestión del proyecto 3. Planificar la calidad
2. **ALCANCE** (6 procesos)	—	1. Planificar la gestión del alcance 2. Recopilar requisitos 3. Definir el alcance 4. Crear la EDT/WBS
3. **CRONOGRAMA** (3 procesos)	—	1. Planificar la gestión del cronograma 2. Desarrollar el cronograma
4. **FINANZAS** (4 procesos)	—	1. Planificar la gestión financiera 2. Estimar los costos 3. Determinar el presupuesto
5. **INTERESADOS** (7 procesos)	1. Identificar a los interesados	2. Planificar el involucramiento de los interesados 3. Planificar las comunicaciones
6. **RECURSOS** (5 procesos)	—	1. Planificar la gestión de recursos 2. Estimar los recursos
7. **RIESGOS** (6 procesos)	—	1. Planificar la gestión de riesgos 2. Identificar los riesgos 3. Realizar el análisis de riesgos 4. Planificar las respuestas a los riesgos
TOTAL	**2 procesos**	**19 procesos**

Procesos que veremos hoy

7. Riesgos



Identifica, analiza y gestiona la **incertidumbre** que puede afectar **los objetivos del proyecto,** definiendo respuestas para reducir amenazas y aprovechar oportunidades que puedan surgir.

Procesos PMBOK® 8

7.1	Planificar la gestión de riesgos
7.2	Identificar los riesgos
7.3	Realizar el análisis de riesgos
7.4	Planificar las respuestas a los riesgos
7.5	Implementar las respuestas a los riesgos
7.6	Monitorear los riesgos

Gestión / Procesos	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	6 Procesos
Riesgos	0	4	1	1	0	6

5 grupos de procesos

Gestión de los Riesgos: Conceptos



¿Qué es el riesgo?

Se define como un **evento o condición incierta** que, si ocurre, tiene un **efecto positivo o negativo** en los objetivos del proyecto.

El objetivo de los procesos de la gestión de los riesgos es **identificar, analizar y dar respuestas a los eventos** que puedan afectar a los objetivos del proyecto.

Tipos de eventos

- Directos o indirectos
- Internos o externos
- Positivos o negativos

Dimensiones de los Riesgos

El riesgo presenta **dos dimensiones** o **factores** clave:



Probabilidad de ocurrencia

Es la **frecuencia** con que un evento se pudiera producir.

Ejemplo

Por experiencias anteriores se sabe que, de **cada 10 entregas** de materiales, en **dos oportunidades el proveedor se atrasa**.

Entonces en 2 de cada 10 entregas (2/10) hay retrasos, o de otro modo, existe una **probabilidad del 20%** de que ello ocurra.



Impacto

El impacto que pueda **ocasionar la ocurrencia del evento** se debe medir, en la medida de lo posible, en unidades monetarias.

Ejemplo

Si dicho retraso en las entregas es en **promedio de 2 días**, y el costo que dicho retraso nos ocasiona es de **$1.000- por día**, el impacto que ese evento ocasionaría sería de **$2.000- en total**.

Dimensiones de los Riesgos

El riesgo presenta **dos dimensiones o factores** clave:



Probabilidad de ocurrencia

Es la **frecuencia** con que un evento se pudiera producir.

Ejemplo

Probabilidad del 20%



Impacto

El impacto que pueda **ocasionar la ocurrencia del evento** se debe medir, en la medida de lo posible, en unidades monetarias.

Ejemplo

$ 2.000 (mil x día)

Valor Monetario Esperado (VME)

Se define como el **producto entre la probabilidad de ocurrencia y el impacto** que ocasionaría medido en unidades monetarias.

VME

VME **= 0,2 * $2.000 = $200**

Tipo de Riesgos



Tipo de Riesgos



R. Externos: Factores fuera del control del equipo, como la competencia, el mercado o el entorno político.

R. Técnicos: Relacionados con la tecnología, los requisitos y la implementación del proyecto.



R. de Gestión:

Vinculados a la planificación, el presupuesto, los plazos y los recursos del proyecto.



Concepto de Gestión de los Riesgos

La **gestión de los riesgos** es un proceso sistemático de **definición, análisis y respuesta a las oportunidades y riesgos** del proyecto, cuyo objetivo es **maximizar los eventos positivos y minimizar los negativos.**



Se evalúan tantos **riesgos** como **oportunidades**.

7. RIESGOS

Proceso 1

Planificar la Gestión de los Riesgos

Consiste en **definir cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos** para un Proyecto.

Prever eventos catalogados como **nuevas oportunidades o riesgos potenciales.**

Documentos de Entrada

- Acta constitución: Requisitos, descripción.
- Registro de interesados: Involucrados, roles
- **Factores ambientales de la Empresa**: Actitud frente al riesgo

El **plan de gestión de riesgos (PGR)** incluye lo siguiente:



- Metodología
- Roles y responsabilidades
- Presupuesto
- Calendario
- Categorías de riesgo

Plan de Gestión de Riesgos (PGR)

El **plan de gestión de riesgos (PGR)** incluye los siguientes elementos:

1 Metodología



Define los **enfoques, herramientas y fuentes de datos** para gestionar los riesgos.

2 Roles y responsabilidades



Define **quién lidera, quién participa** y las **responsabilidades** de los integrantes de gestión de riesgos para cada actividad del PGR.

3 Presupuesto



Establece los **recursos y fondos** destinados a la gestión de riesgos y las **reservas para contingencias.**

4 Calendario



Define **cuándo** y **con qué frecuencia** se realizarán las actividades de gestión de riesgos durante el proyecto.

5 Categorías de riesgo



Agrupan las **causas potenciales de los riesgos,** utilizando criterios como los objetivos o áreas del proyecto.

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

¿Qué es la RBS?

Ayuda al equipo del proyecto a **tener en cuenta las numerosas fuentes que pueden dar lugar a riesgos** del proyecto en un ejercicio de identificación de estos.

La **RBS** es una representación jerárquica de los riesgos según sus categorías.



La Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) permite **observar de manera gráfica el agrupamiento de los riesgos** de acuerdo con sus características.

Ejemplo: riesgos inherentes a la gestión del proyecto, riesgos relativos a la tecnología o riesgos debido a los recursos humanos, entre otros.

Permite **analizar los posibles riesgos** a los cuales el proyecto se podría enfrentar.

Proceso 2 Identificar los Riesgos

Propósito

Determinar los **riesgos** que pueden afectar al proyecto y **documentar sus características.**

¿Qué se hace?

Se identifican posibles eventos que pueden afectar positiva o negativamente al proyecto **(amenazas y oportunidades)**, analizando distintas **fuentes de riesgo** y aprovechando la **experiencia y conocimiento** del equipo, de los interesados y de expertos.

Resultado

Se obtiene una **lista o registro inicial de riesgos**, que servirá como base para su posterior análisis y definición de respuestas.

Tipos de riesgos

Amenazas

Eventos que pueden tener un impacto **negativo** en los objetivos del proyecto.

Oportunidades

Eventos que pueden tener un impacto **positivo** en los objetivos del proyecto.

Proceso de identificación



Identificar

Generar ideas de posibles riesgos (amenazas y oportunidades).

Documentar

Describir sus características (causas, impactos, categorías, etc.).

Registrar

Consolidar la información en un registro inicial de riesgos.

Proceso 2 Técnicas para identificar riesgos

Para identificar los riesgos del proyecto se pueden utilizar **distintas técnicas** que permiten obtener información desde **diferentes perspectivas.**



1. **Tormenta de ideas (Brainstorming)**



2. **Técnica Delphi**



3. **Entrevistas**



4. **Análisis de causa raíz**



5. **Análisis DAFO**

Estas técnicas se complementan y ayudan a obtener una **lista inicial de riesgos** del proyecto.

Proceso 2 Tormenta de ideas (Brainstorming)

Objetivo

Obtener una **lista amplia de los riesgos** del proyecto.

Participantes

- Equipo del proyecto
- Expertos de distintas áreas (cuando corresponda)
- **Facilitador** que conduce la sesión

Apoyo

Se pueden utilizar **categorías de riesgo**, como en una **estructura de desglose de riesgos (RBS)**, para guiar la generación de ideas.

Proceso de la tormenta de ideas

1 Definir el foco



Precisar el alcance, objetivo y áreas o categorías de riesgo a considerar.

2 Generar ideas



El equipo y los expertos proponen posibles eventos que pueden afectar al proyecto.

3 Agrupar ideas



Se revisan y agrupan ideas similares.

4 Identificar y categorizar los riesgos



Se definen y registran los riesgos, clasificándolos según su tipo (amenazas u oportunidades) y categoría.

Proceso 2 Técnica Delphi y Entrevistas

1 Técnica Delphi

Objetivo

Lograr un **consenso de expertos** sobre los riesgos más importantes del proyecto.

- Participan expertos en riesgos.
- La consulta se realiza de forma **anónima.**
- Se utilizan cuestionarios en **varias rondas.**
- Las respuestas son resumidas y enviadas nuevamente a los expertos para recibir comentarios adicionales.
- Ayuda a **reducir sesgos** en los datos y evita que cualquier persona ejerza influencias indebiidas.



2 Entrevistas

Objetivo

Obtener información de **participantes experimentados, interesados y expertos** para identificar riesgos.



- Se realizan conversaciones estructuradas.
- Participan miembros del **equipo, interesados y expertos** en la materia.
- Se identifican riesgos a partir de su experiencia y conocimiento.
- Permite descubrir riesgos que pueden no ser evidentes en la documentación.

Proceso 2 Análisis de causa raíz

Permite identificar las **causas subyacentes** que pueden originar un problema o un riesgo, con el fin de orientar **acciones preventivas**.

Causa



Origen o motivo que puede generar el riesgo.

Riesgo



Evento incierto que puede ocurrir debido a la causa.

Consecuencia



Efecto potencial en el proyecto si el riesgo se materializa.

Ejemplo

Causa



Capacidad insuficiente del servidor.

Riesgo



Indisponibilidad de la aplicación de reserva.

Consecuencia



Estudiantes y docentes no pueden realizar o consultar reservas.

Proceso 2 Análisis DAFO

El análisis DAFO permite identificar **factores internos y externos** del proyecto, que pueden ayudar a descubrir riesgos potenciales, especialmente **amenazas y oportunidades**.

	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Factores internos (del proyecto)	**Fortalezas (F)** • Recursos propios • Capacidades del equipo • Conocimientos y experiencia • Tecnologías disponibles	**Debilidades (D)** • Falta de experiencia • Recursos limitados • Procesos poco definidos • Dependencia de terceros
Factores externos (del entorno)	**Oportunidades (O)** • Nuevas tecnologías • Apoyo institucional • Alianzas estratégicas • Crecimiento de la demanda	**Amenazas (A)** • Cambios normativos • Competencia • Riesgos del entorno • Dependencia de proveedores

Para la gestión de riesgos

- Las **amenazas** pueden generar **riesgos** que afecten el proyecto.
- Las **oportunidades** también pueden representar **riesgos** o condiciones que deben ser **gestionadas** adecuadamente.

El análisis DAFO ayuda a identificar **riesgos potenciales** desde una visión interna y externa del proyecto.

Proceso 2 DAFO estratégico

El análisis DAFO no solo permite describir la situación del proyecto, sino que también **orienta posibles estrategias** a partir del cruce de sus factores.

	Oportunidades (O) Factores externos positivos	**Amenazas (A)** Factores externos negativos
Fortalezas (F) Factores internos positivos	**F + O** **Estrategia ofensiva** Utilizar las fortalezas del proyecto para aprovechar las oportunidades del entorno.	**F + A** **Estrategia defensiva** Utilizar las fortalezas del proyecto para reducir o mitigar las amenazas del entorno.
Debilidades (D) Factores internos negativos	**D + O** **Estrategia de mejora** Superar las debilidades del proyecto para aprovechar las oportunidades del entorno.	**D + A** **Estrategia de supervivencia** Minimizar las debilidades del proyecto para evitar o reducir el impacto de las amenazas del entorno.

Uso en la gestión de riesgos

- El análisis DAFO ayuda a **identificar amenazas y oportunidades** que pueden representar riesgos para el proyecto.
- Será especialmente útil en el proceso posterior de **respuestas a los riesgos**, al definir estrategias para aprovechar oportunidades y mitigar amenazas.

Proceso 2 Resultado del proceso 2: Registro de riesgos

Los riesgos identificados se documentan en un **registro de riesgos,** que permitirá **analizarlos** en el siguiente proceso (Proceso 3: Analizar los riesgos).

El registro de riesgos incluye, al menos:
riesgo, causa, consecuencia y categoría.

Ejemplo

Riesgo	Causa	Consecuencia	Categoría
Retraso en la entrega de requerimientos.	Falta de disponibilidad de los usuarios clave para validar los requerimientos.	Retraso en el desarrollo y en las pruebas del sistema.	Interesados
Cambios en la normativa de protección de datos.	Actualización de leyes y regulaciones en el manejo de datos personales.	Necesidad de realizar ajustes en los requerimientos, en el diseño y en la implementación del sistema.	Legal / Regulatorio

Este registro será la base para evaluar posteriormente la **probabilidad, impacto y nivel** de cada riesgo, en el Proceso 3.

Actividad parcial – Identificar riesgos

Entregable 6

Objetivo:

Aplicar las técnicas revisadas para **identificar y documentar los riesgos** de su proyecto.

Ejemplo: App Reserva de Laboratorios

1 Brainstorming

Identificar posibles eventos que puedan afectar el proyecto.



2 Análisis DAFO

Revisar Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas para detectar riesgos adicionales.

F	D
O	A

3 Registrar riesgos

Determinar el riesgo, su causa, consecuencia y categoría.



Registro de riesgos (ejemplo)

Riesgo	Causa	Consecuencia	Categoría
Indisponibilidad de la App	Sobrecarga del servidor o mantenimiento inadecuado.	Los usuarios no pueden realizar reservas.	Tecnológico
Retraso en la validación de requerimientos.	Baja disponibilidad de usuarios clave.	Retraso en el desarrollo del sistema.	Interesados
Pérdida de información de reservas	Fallas en respaldo o BD.	Pérdida de reservas registradas.	Tecnológico

Ahora, aplíquenlo a su proyecto

1. Realicen una sesión de brainstorming en su equipo.
2. Analicen su proyecto con la matriz DAFO.
3. Identifiquen los riesgos.
4. Determinen la causa, la consecuencia y la categoría de cada riesgo.
5. Registren los resultados en una tabla como la del ejemplo.

Importante

Por ahora **NO evalúen probabilidad, impacto ni nivel de riesgo.** Eso se realizará en el Proceso 3: Análisis de Riesgos.

Proceso 3 Realizar el análisis cualitativo de los riesgos

Propósito:
Priorizar los riesgos identificados para determinar cuáles requieren mayor atención y acciones posteriores.

Proceso 2

Identificamos y documentamos los riesgos.



Proceso 3

Evaluamos y priorizamos los riesgos.



Proceso 4

Planificamos y definimos respuestas a los riesgos.

¿Qué haremos en este proceso?

- Analizar la **probabilidad** de ocurrencia de cada riesgo.
- Analizar el **impacto** en los objetivos del proyecto.
- Determinar el **nivel de riesgo** (combinación de probabilidad e impacto).
- **Priorizar** los riesgos para identificar cuáles requieren mayor atención y acciones en los próximos procesos.

Proceso 3 ¿Cómo analizaremos cada riesgo?

Cada riesgo identificado se analiza siguiendo los siguientes pasos, lo que permitirá determinar su **nivel de riesgo** y **priorizar** aquellos que requieren mayor atención.

1 Riesgo identificado

Tomamos cada riesgo del registro de riesgos del Proceso 2.



2 Evaluar probabilidad e impacto

Estimamos la probabilidad de ocurrencia y el impacto en los objetivos del proyecto.




Probabilidad



Impacto

3 Ubicar en la RAM

Con la probabilidad y el impacto, ubicamos el riesgo en la matriz de probabilidad e impacto (RAM).

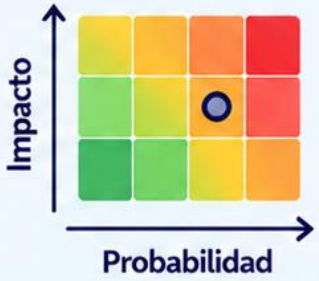

4 Determinar nivel de riesgo

Según la posición en la RAM, se asigna el nivel de riesgo (Bajo, Medio o Alto).



Proceso 3 Probabilidad del riesgo

La probabilidad del riesgo indica **qué tan probable es que ocurra** un evento de riesgo durante el proyecto.

¿Qué tan probable es que ocurra?
Utilizaremos una escala de 1 a 5, con las siguientes definiciones:

Valor	Nivel de probabilidad	Definición
1	Improbable	Es muy poco probable que ocurra. Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.
2	Posible	Es poco probable que ocurra. Podría ocurrir en algún momento del proyecto.
3	Ocasional	Tiene una probabilidad moderada de ocurrencia. Podría ocurrir en algunas ocasiones durante el proyecto.
4	Frecuente	Es probable que ocurra. Se espera que ocurra varias veces durante el proyecto.
5	Muy frecuente	Es muy probable que ocurra. Se espera que ocurra con alta frecuencia durante el proyecto.

Proceso 3 Impacto o criticidad del riesgo


El impacto o criticidad del riesgo indica **qué tan grave sería el efecto en el proyecto** si el riesgo llegara a ocurrir.

Si ocurre, ¿qué tan grave sería su efecto en el proyecto?
Utilizaremos una escala de 1 a 5, con las siguientes definiciones:

Valor	Nivel de criticidad	Definición
1	Insignificante	Genera un efecto mínimo en los objetivos del proyecto. No requiere cambios relevantes en el alcance, tiempo, costo o calidad.
2	Leve	Genera un efecto menor en los objetivos del proyecto. Puede requerir pequeños ajustes en el alcance, tiempo, costo o calidad.
3	Moderado	Genera un efecto significativo en los objetivos del proyecto. Puede requerir ajustes importantes en el alcance, tiempo, costo o calidad.
4	Crítico	Genera un efecto muy significativo en los objetivos del proyecto. Puede poner en riesgo el cumplimiento de los plazos, presupuesto o calidad del proyecto.
5	Catastrófico	Genera un efecto muy grave en los objetivos del proyecto. Puede provocar el fracaso del proyecto o la imposibilidad de alcanzar sus objetivos principales.

Proceso 3 Matriz de evaluación de riesgos (RAM)

La Matriz de evaluación de riesgos (RAM) permite determinar el **nivel de riesgo** combinando la **probabilidad** de ocurrencia y el **impacto**.

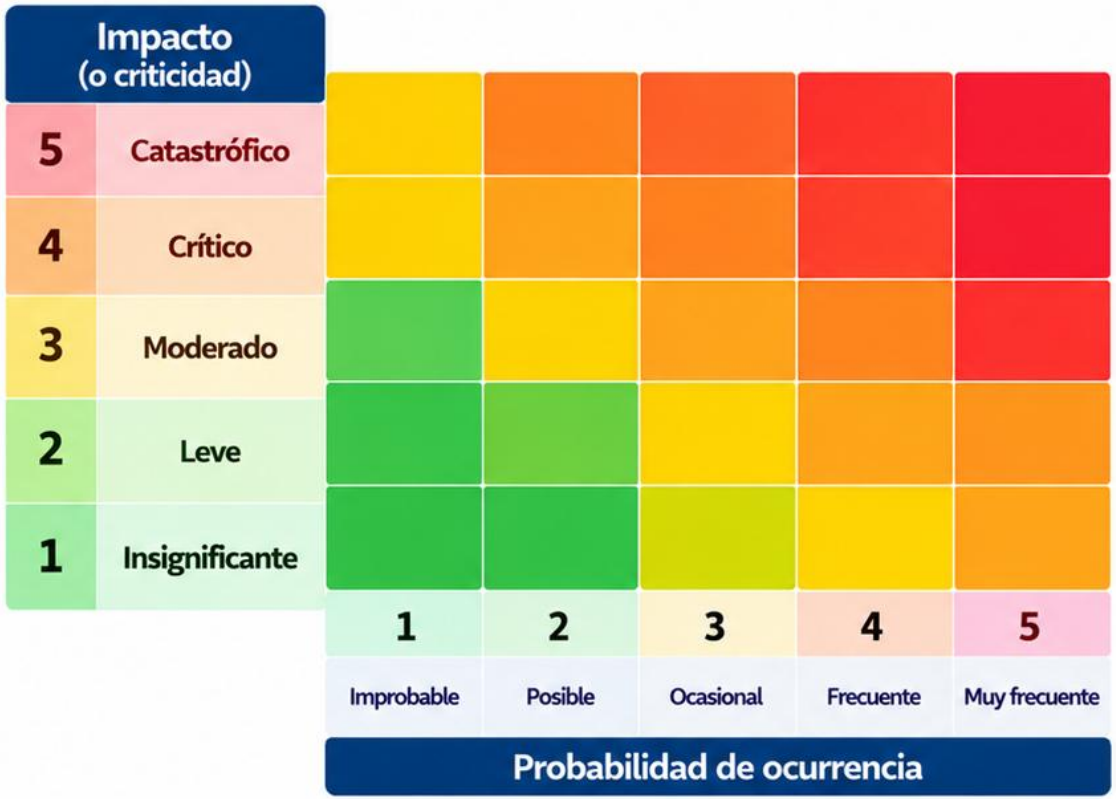

¿Cómo leer la matriz?

1. Seleccionar la **probabilidad** del riesgo (eje horizontal).
2. Seleccionar el **impacto** del riesgo (eje vertical).
3. Encontrar la **intersección** de ambos valores.
4. El color de la celda indica el **nivel de riesgo**.


Nivel de riesgo (según color)

Bajo	Medio	Alto	Muy alto
(Requiere monitoreo)	(Requiere atención)	(Requiere acción)	(Requiere acción inmediata)

Proceso 3 Nivel de riesgo

El **nivel de riesgo** se obtiene del cruce entre la **probabilidad** de ocurrencia y el **impacto**, según la matriz de evaluación de riesgos (RAM).

Matriz de evaluación de riesgos (RAM)

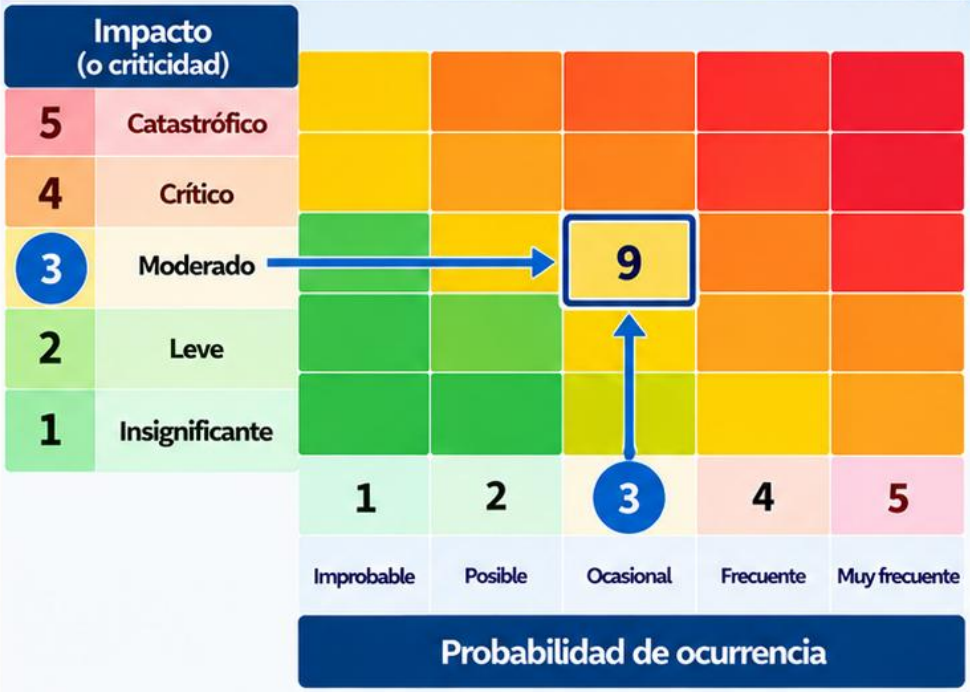

Nivel de riesgo (cálculo numérico)

El nivel de riesgo se determina multiplicando los valores de probabilidad e impacto.

Nivel de riesgo = Probabilidad x Impacto

Ejemplo

Probabilidad		Impacto		Nivel de riesgo
Ocasional (3)	X	Moderado (3)	=	9 → Medio

Rangos de nivel de riesgo (según color)

Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto	Extremo
(1 – 2)	(3 – 5)	(6 – 10)	(11 – 16)	(17 – 20)	(21 – 25)

Proceso 3 Ejemplo: App Reserva de Laboratorios

Contexto del proyecto

Aplicación web que permite gestionar la reserva de laboratorios de la USM, facilitando la asignación y el uso de los espacios por parte de estudiantes y docentes.

Riesgo


Indisponibilidad del sistema durante períodos de alta demanda.

Causa

Sobrecarga del servidor o capacidad insuficiente.

Consecuencia

Los estudiantes y docentes no pueden realizar o consultar reservas de laboratorios.

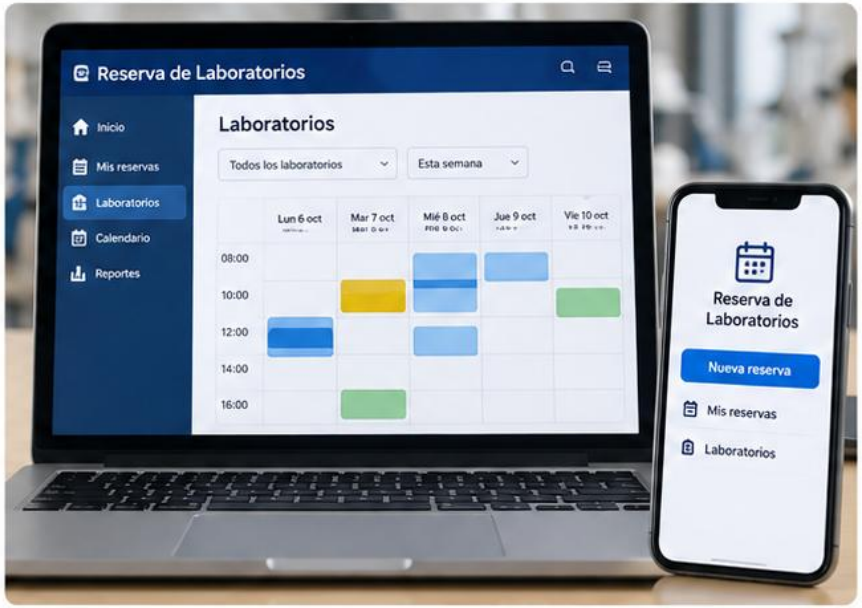

Según la escala vista, respondan:

1. ¿Qué tan probable es que ocurra este riesgo?
2. ¿Qué impacto tendría en el proyecto si ocurre?

Proceso 3

Riesgo: Indisponibilidad del sistema durante períodos de alta demanda.

1. Probabilidad del riesgo

¿Qué tan probable es que ocurra?

Valor	Nivel de probabilidad	Definición
5	Muy frecuente	Ocurre muy a menudo en el proyecto.
4	Frecuente	Es probable que ocurra varias veces.
3	Ocasional	Puede ocurrir en algunas ocasiones.
2	Posible	Podría ocurrir en algún momento.
1	Improbable	Es poco probable que ocurra.

2. Impacto o criticidad del riesgo

¿Qué tan grave sería su efecto en el proyecto?

Valor	Nivel de impacto (criticidad)	Definición
5	Catastrófico	Genera un efecto muy grave. Puede impedir el logro de los objetivos.
4	Crítico	Genera un efecto muy significativo. Puede afectar el cumplimiento de los plazos, costo o calidad.
3	Moderado	Genera un efecto significativo. Puede requerir ajustes importantes.
2	Leve	Genera un efecto menor. Puede requerir pequeños ajustes.
1	Insignificante	Genera un efecto mínimo. No requiere cambios relevantes.

Según la escala vista, respondan:

1. ¿Qué tan probable es que ocurra este riesgo?
2. ¿Qué impacto tendría en el proyecto si ocurre?

Proceso 3 Paso 1 y 2: Probabilidad e impacto

Ejemplo: App Reserva de Laboratorios

Evaluamos la probabilidad de ocurrencia e impacto (criticidad) del riesgo identificado.

Riesgo: Indisponibilidad del sistema durante períodos de alta demanda.

1. Probabilidad del riesgo

¿Qué tan probable es que ocurra?

Valor	Nivel de probabilidad	Definición
5	Muy frecuente	Ocurre muy a menudo en el proyecto.
4	Frecuente	Es probable que ocurra varias veces.
3	Ocasional	Puede ocurrir en algunas ocasiones.
2	Posible	Podría ocurrir en algún momento.
1	Improbable	Es poco probable que ocurra.

Probabilidad seleccionada: Ocasional (3)

Puede presentarse **en períodos de alta demanda.**

2. Impacto o criticidad del riesgo

¿Qué tan grave sería su efecto en el proyecto?

Valor	Nivel de impacto (criticidad)	Definición
5	Catastrófico	Genera un efecto muy grave. Puede impedir el logro de los objetivos.
4	Crítico	Genera un efecto muy significativo. Puede afectar el cumplimiento de los plazos, costo o calidad.
3	Moderado	Genera un efecto significativo. Puede requerir ajustes importantes.
2	Leve	Genera un efecto menor. Puede requerir pequeños ajustes.
1	Insignificante	Genera un efecto mínimo. No requiere cambios relevantes.

Impacto seleccionado: Crítico (4)

Impediría temporalmente realizar reservas y afectaría la operación del servicio.

Cálculo del nivel de riesgo

Probabilidad (3) X Impacto (4) = **12**

Proceso 3 Paso 3: Ubicar el riesgo en la RAM

Con los valores de **probabilidad e impacto,** ubicamos el riesgo en la matriz de evaluación de riesgos (RAM) para obtener su nivel.

Matriz de evaluación de riesgos (RAM)

Probabilidad de ocurrencia		Impacto o criticidad				
		1 Insignificante	2 Leve	3 Moderado	4 Crítico	5 Catastrófico
5	Muy frecuente					
4	Frecuente					
3	Ocasional				12	
2	Posible					
1	Improbable					

Valores del ejemplo

Probabilidad: Ocasional (3)

Impacto (criticidad): Crítico (4)

Ubicación en la RAM

La intersección de la fila "Ocasional (3)" con la columna "**Crítico (4)**" corresponde al valor **12**.

Resultado en la matriz: Ocasional (3) X Crítico (4) = **12**

Actividad | Identificar riesgos de su proyecto

Primero aplican el **Proceso 2.** Revisan módulos, funcionalidades y actividades del proyecto. Realizan **Brainstorming** y complementan con **DAFO.**

Resultado: cada equipo genera una lista de riesgos de su propio proyecto.

Brainstorming



Generamos ideas y posibles riesgos en equipo.

DAFO

D Debilidades	**A** Amenazas
F Fortalezas	**O** Oportunidades

Analizamos y organizamos las ideas en el DAFO.

Lista de riesgos



Cada equipo genera una lista de riesgos de su propio proyecto.

Resultado

Lista de riesgos del proyecto

Actividad | Evaluar los riesgos

Ahora aplican el **Proceso 3** a los **riesgos** encontrados:

1



Seleccionar el riesgo.

Elijan el riesgo que desean evaluar de su lista.

2



Asignar probabilidad.

Estimen qué tan probable es que ocurra el riesgo.

3



Asignar impacto.

Determinen qué tan grave sería su efecto en el proyecto.

4



Ubicarlo en la RAM.

Coloquen el riesgo en la matriz de evaluación.

5



Determinar su nivel de riesgo.

Identifiquen si el riesgo es bajo, medio, alto o crítico.

Resultado

Evaluación de riesgos del proyecto

Diapositiva 21 | Entregable: Matriz de riesgos

Resultado esperado de la actividad:
Tabla inicial de riesgos de su proyecto.

Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel
Indisponibilidad de la App de Reserva	Sobrecarga del servidor	Imposibilidad temporal de reservar	Ocasional (3)	Crítico (4)	Alto 12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

La matriz de riesgos conecta con el **Proceso 4,** porque después podrán decidir qué hacer con los riesgos de mayor prioridad.

Secuencia global

Proceso 2: IDENTIFICAR
Brainstorming + Delphi + Entrevistas + Causa raíz + DAFO

↓

Registro inicial de riesgos

↓

Proceso 3: ANALIZAR
Probabilidad + Impacto → RAM → Nivel

↓

Matriz de riesgos priorizada

↓

Proceso 4:
Planificar las respuestas a los riesgos

Siguiente clase

Clase 11

Fase de Planificación

Planificando el camino hacia el éxito



Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

29 de septiembre de 2026

Laboratorio
P701
